

Construcción Línea de Conducción de Agua Potable del Tanque Tecnológico Al Tanque Agua Azul

Fecha: 06 de Noviembre del 2008

Avances
78.88%

3,928.00 m.l. 14" PVC


0.00 m.l. 14" PAD

0.00 m.l. 20" ACERO

Simbologia

 Proyecto

 Ejecutado

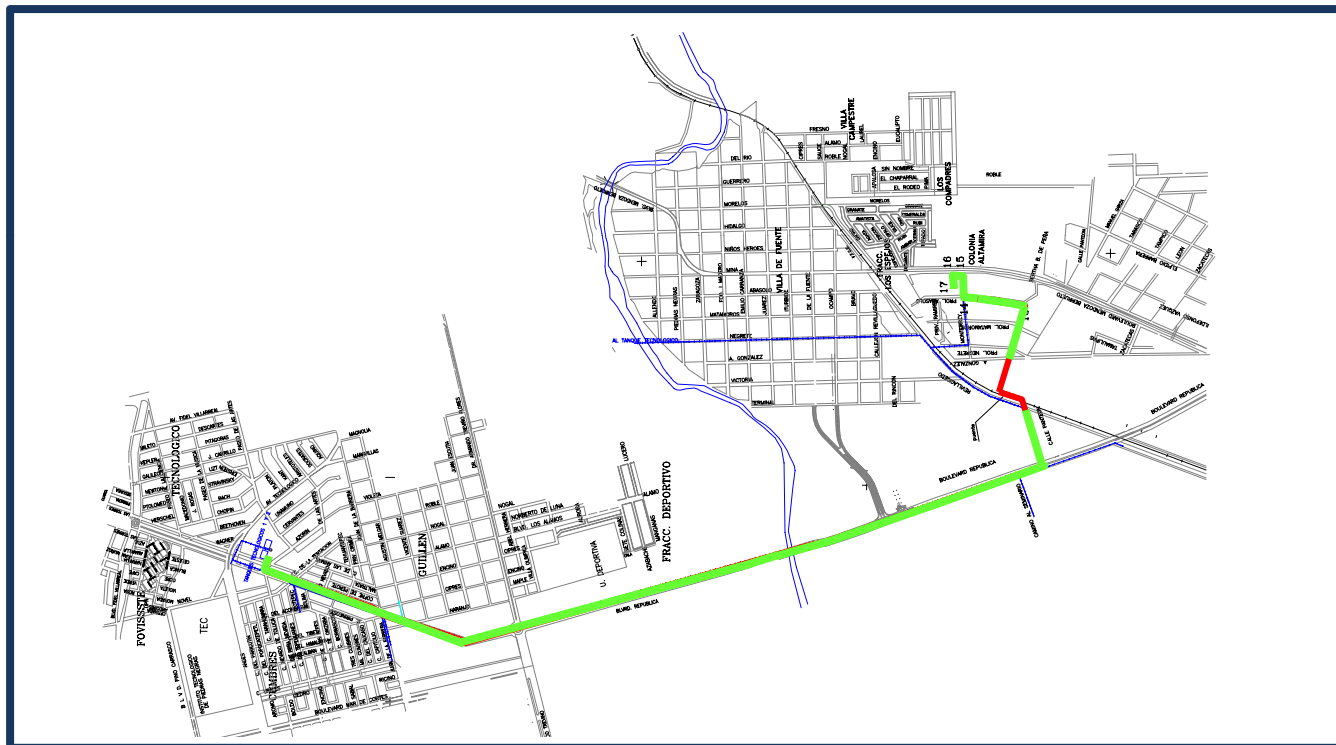

Metas

4,839.00 m.l. 14" diam. PVC

70.00 m.l. 14" diam. PAD

70.00 m.l. 20" diam. Acero (Camisa para tub. PAD)

Inversión

\$2'789,253.42 (Mano de Obra)

\$2'335,194.50 (Adquisición)

\$5'124,447.92 (Total Inversión)

Pobl. Benef.

35,000 hab.
