



Proyecto Integral de Saneamiento Ambiental (Concesionaria)

Inversión \$ 20'765,649.96




Proyecto Integral de Saneamiento Ambiental

CONCESIONARIA


Nº	O B R A	Diam.	Long.	Ejecutado Long.	IMPORTE CONTRATO	EJECUTOR	EJERCIDO	AVANCE FISICO (%)
CONCESIONARIA								
1	CONSTRUCCION DEL COLECTOR MARGINAL EL TORNILLO (CROC, 7 CASAS)	8"	4,084.70 M.L.	4,084.70 M.L.	\$ 2,576,896.00	CONCESIONARIA	\$ 2,425,533.46	100%
2	CONSTRUCCION DEL COLECTOR MARGINAL EL TORNILLO	12"	1,070.00 M.L.	944.30 M.L.				88%
3	COLECTOR MARGINAL RIO BRAVO	30"	3,400.00 M.L.	3,400.00 M.L.	\$ 16,366,393.99	CONCESIONARIA	\$ 16,039,066.11	98%
		36"	3,408.00 M.L.	3,408.00 M.L.				
4	RED DE ATARJEAS COL. LAS MALVINAS	8"	1,235.70 M.L.	1,235.70 M.L.	\$ 1,020,208.00	CONCESIONARIA	\$ 1,020,208.00	100%
		12"	782.40 M.L.	782.40 M.L.				
5	ADECUACION DE CARCAMO 4 DE AGUAS RESIDUALES EN RIO BRAVO	carcamo		carcamo	\$ 1,280,842.39	CONCESIONARIA	\$ 1,280,842.39	100%
TOTAL DE INVERSION EN OBRAS CONCESIONARIA:					\$ 21,244,340.38		\$ 20,765,649.96	



CROC, 7 CASAS, BRAVO Y MARGINAL EL TORNILLO

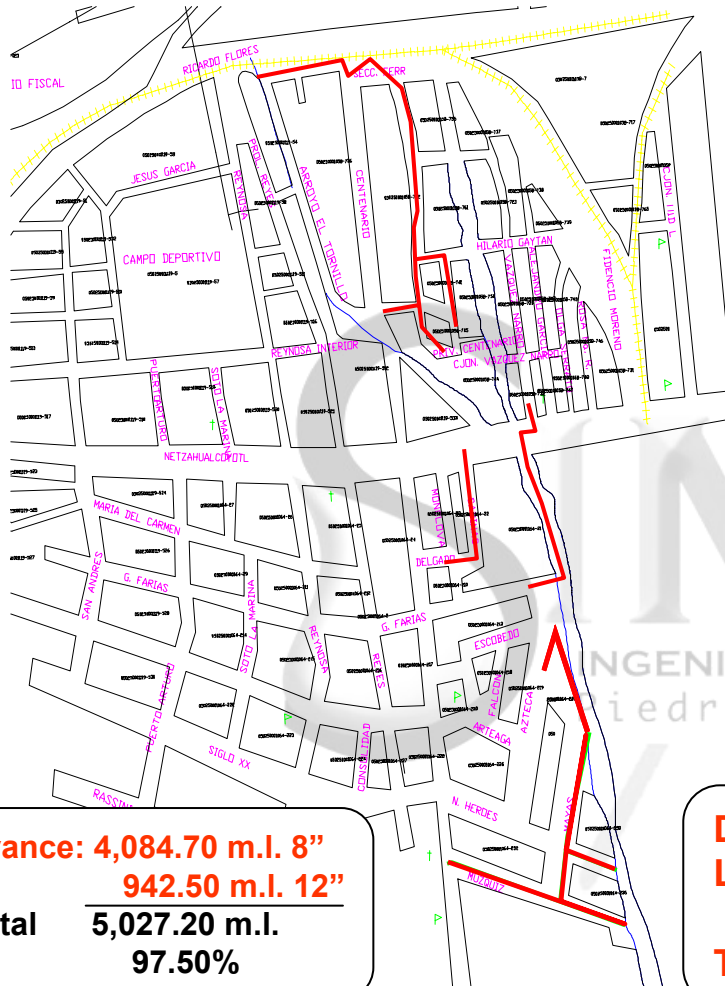

Avance: 4,084.70 m.l. 8"
942.50 m.l. 12"
Total 5,027.20 m.l.
97.50%

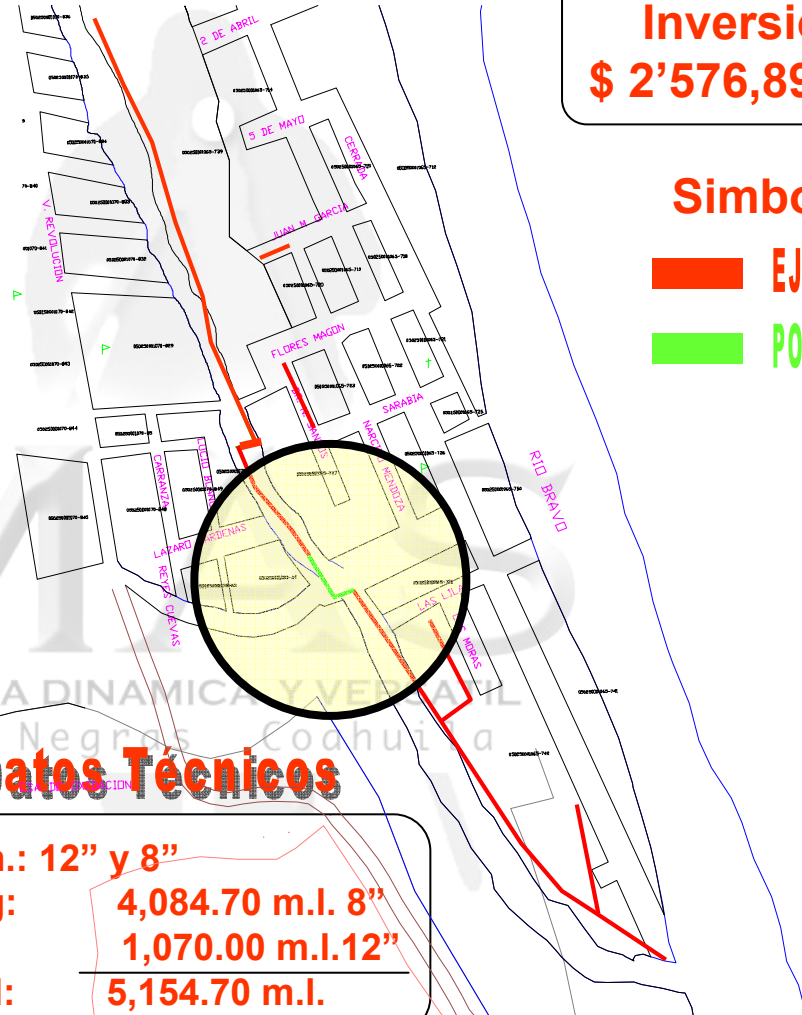

Inversión
\$ 2'576,896.00

Simbología
EJECUTADO
POR EJECUTAR

Datos Técnicos

Diam.: 12" y 8"
Long: 4,084.70 m.l. 8"
1,070.00 m.l. 12"
Total: 5,154.70 m.l.




COLECTOR MARGINAL RIO BRAVO

Inversión
\$ 16'366,393.99

Puente Internacional I

Carcamo 4

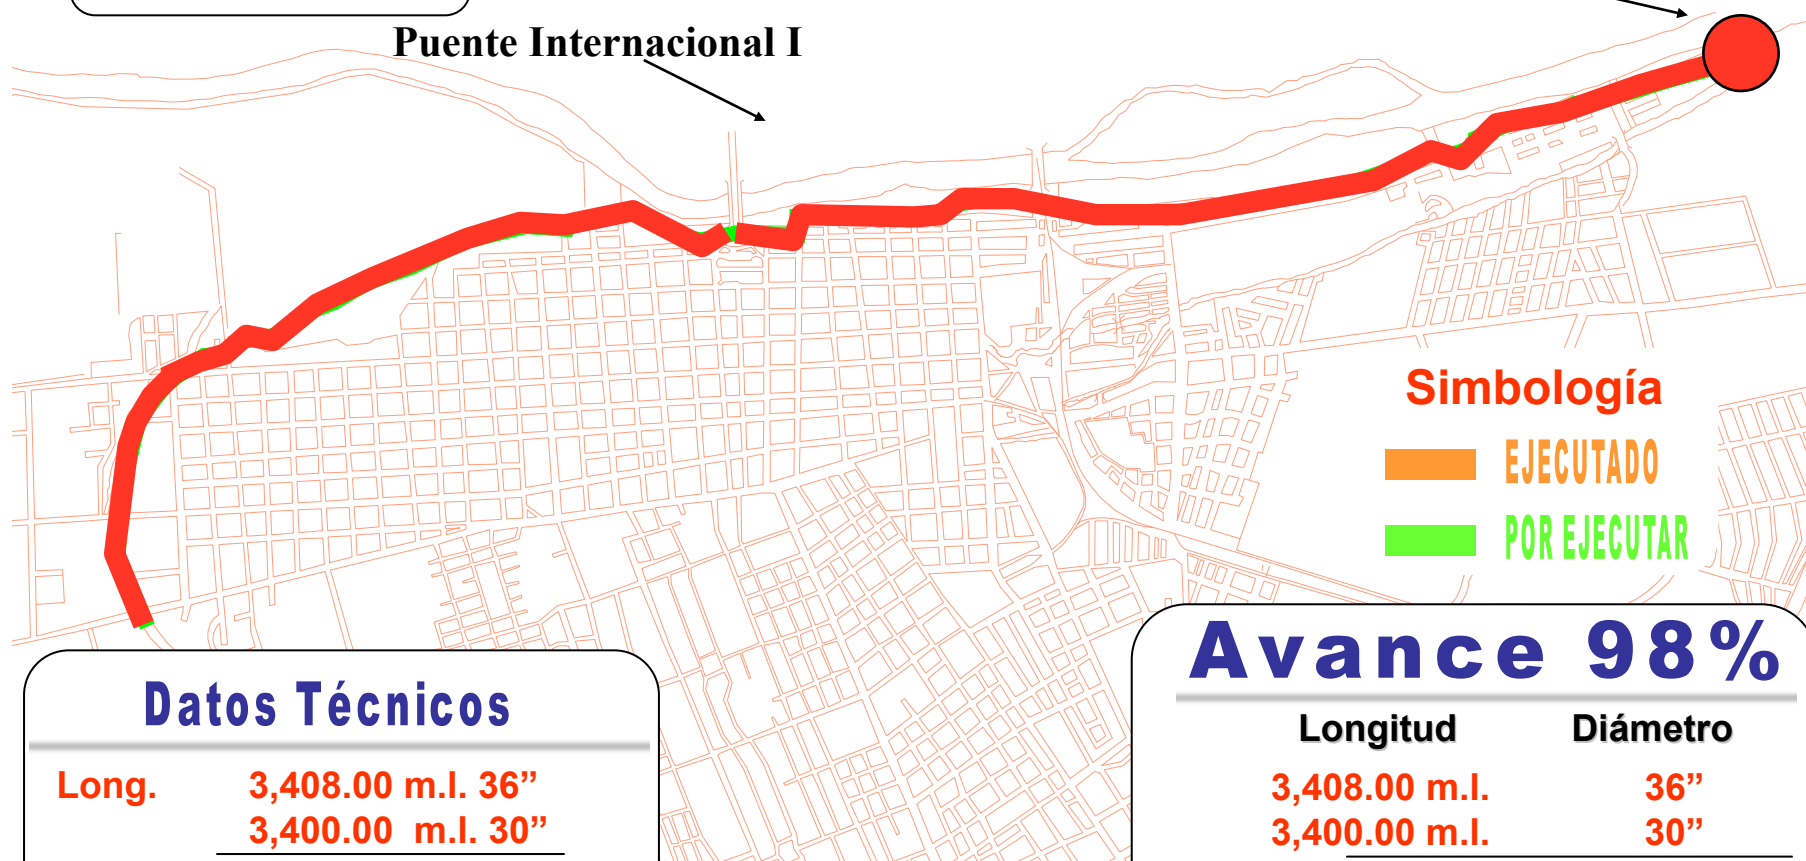

Simbología

EJECUTADO

POR EJECUTAR

Datos Técnicos

Long.	3,408.00 m.l. 36"
	3,400.00 m.l. 30"
Total:	6,808.00 m.l.

Avance 98%

Longitud

Diámetro

3,408.00 m.l.

36"

3,400.00 m.l.

30"

Avance Total 6,808.00 m.l.



Red de Atarjeas Colonia Las Malvinas

Simbología



Datos Técnicos

Long: 1,235.70 m.l. 8"
782.40 m.l. 12"

2,018.10 m.l.

Inversión
\$ 1'020,208.00

Avance:
1,235.70 m.l. 8"
782.40 m.l. 12"

2,018.10 m.l.
100%

